


□ 추진실적

- 타당성 조사 및 기본계획 승인 : 2016. 11. ~ 2017. 1.
- 지방재정투자심사(전라남도), 계약심사 승인 : 2017. 5.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2017. 12.
- 군 관리계획 변경 용역 착수(일반주거 1종→2종) : 2018. 4.

□ 향후 추진 계획

- 실시설계 및 군 관리계획 변경 용역 완료 : 2019. 1.
- 주택건설 사업계획 승인, 계약심사(전라남도) : 2019. 2.
- 공사 및 감리 계약 : 2019. 2. ~ 3.
- 공사 착수 : 2019. 4.
- 입주자 모집공고 및 확정 : 2020. 3. ~ 5.
- 준공 및 입주 : 2020. 10.

현황 사진

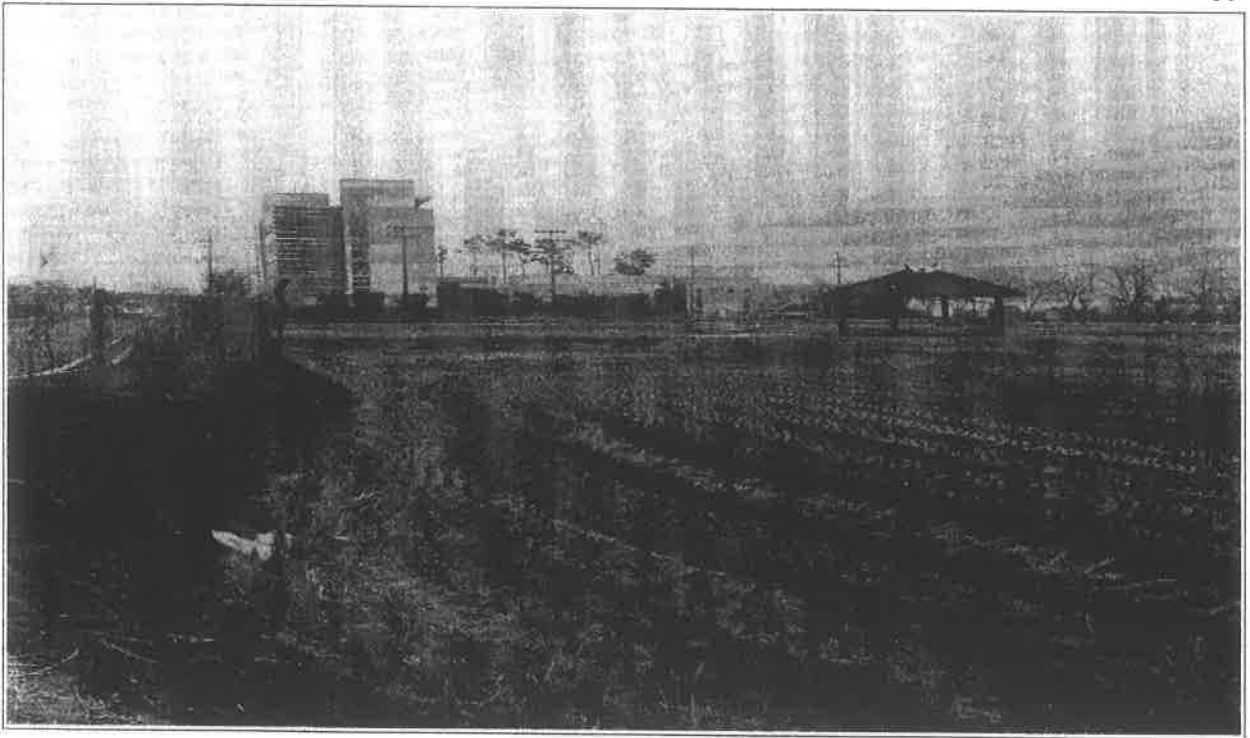

위치도

