

**P7-19****자전거길, 트레킹코스 등 섬진강 생태탐방로 조성**

사업구분			추진부서	
임지구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	구례군	신규	지역경제과	시설6급/이홍우/780-2482
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	장기	2022년	일부추진	15%
사업목표	자전거길 등 섬진강 생태탐방로 조성			

**□ 사업개요**

- 사업명: 섬진강 힐링 자전거길 조성
- 위치: 구례읍 논곡리~신월리, 간전면 양천리~운천리
- 사업량: L=22km (논곡리~신월리 13km, 양천리~운천리 9km), B=2m
- 사업기간: 2019년 ~ 2024년
- 총사업비: 20,000백만원(국비 75% 군비25%)
- 사업주관: 행정안전부, 구례군
- 사업내용: 자전거길(22km), 연결교 2개소

**□ 연도별 계획(성과지표)**

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	섬진강 자전거길 연결 교량 2개소 착공(구례군 발주)	10
2019년	익산청 섬진강 자전거길 연결 건의, 연결 교량 2개소 준공	40
2020년	공사 착공	50
2021년	공사 추진	70
2022년	공사 추진	80
2022년 이후	공사 완료	100

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	20,000	300	1,930	2,300	1,000	3,000	5,000	9,040							
국비	12,000	180	720	900	1,000	3,000	5,000	9,040							
도비															
군비	8,000	120	1,180	1,400											
기타															

추진실적

- 섬진강 생태탐방로 연결보도교 조성사업 착공 : 2018. 6.
- 자전거 교통사고 위험지역 실태조사 : 2018. 11.


문제점 및 대책

- 섬진강 자전거길 미개설 구간 연결에는 많은 예산이 소요될 것으로 예상되며, 중앙부처의 자전거길에 대한 예산배정을 하지 않는 실정.
- 익산국토관리청과 협의하여 섬진강 하천기본계획 재정비 시 자전거길 반영될 수 있도록 지속적 건의.

향후 추진 계획(또는 완료 시 추진성과)

- 익산지방국토관리청 자전거길 연결사업 건의 : 2019. 1.
- 섬진강 자전거길 교행공간 및 편의시설 설치신청 : 2019. 1.
- 섬진강 생태탐방로 연결보도교 설치 완료 : 2019. 12.
- 수달생태탐방로 보도교 설치 완료 : 2020. 12.

## 현황 사진

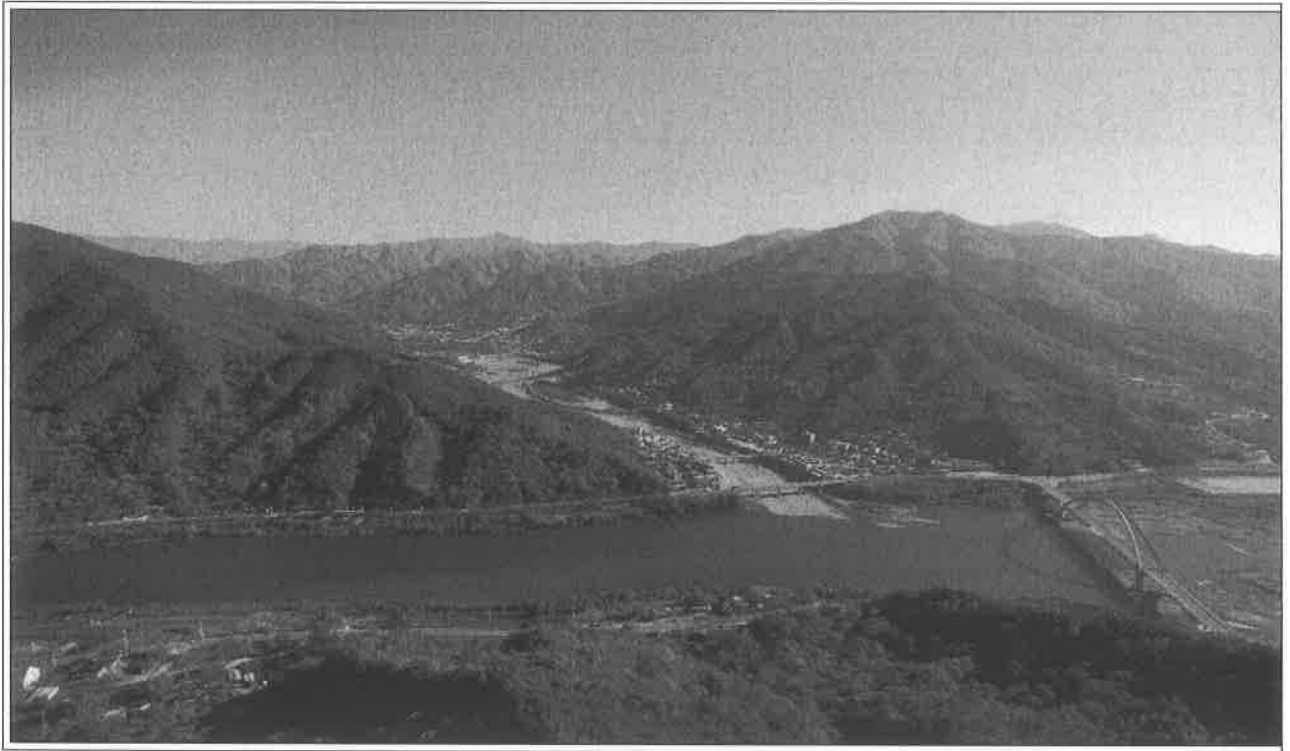

## 위치도

