

**P7-40****지리산정원 지구 짚 라인 설치**

사업구분			추진부서	
임지구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	구례군	계속	문화관광과	지방시설주사보/이재근/2544
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	중기	2022년	정상추진	40%
사업목표				

**□ 사업개요**

- 위 치 : 구례군 광의면 온당리, 산동면 이평리 일원
- 사업량 : 짚 라인, 모노레일, 전기 차 운행, 편의시설 확충
- 사업비 : 총 230억(기존사업 120억, 금회 추가분 110억)
- 사업기간 : 2014. ~ 2022.(8년)
- 사업내용
  - 짚라인 설치(총 3.3km)
    - 기존 L=1.1km(지초봉~야생화 테마랜드 관리소)
    - 추가 1안 L=2.2km(지초봉~야생화 테마랜드 관리소~까치절산~치즈랜드)
    - 추가 2안 L=2.2km(지초봉~야생화 테마랜드 관리소~온동마을~치즈랜드)
  - 모노레일(총 2.4km)
    - 기존 L= 0.8km(생태 숲 방문자 센터)
    - 추가 L= 1.6km(유선장~짚라인 1단계 하차장)
  - 전기 차 운행 : 2대 L=3.6km(모노레일 입구, 야생화 테마랜드)

**□ 연도별 계획(성과지표)**

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	1단계 짚라인 및 모노레일 설계완료 및 착공 짚라인, 모노레일 공사 추진, 추가분에 따른 투융자 심사, 공유재산관리계획 변경(토지매입 추가)	25
2019년	짚라인, 모노레일 공사 준공(1단계), 2단계 실시설계용역 (환경, 재해 등 포함)추진	40
2020년	1단계 운영, 2단계 공사 착공(기반시설 진입로 및 주차장 등)	60
2021년	2단계 공사 추진(기반시설 부분 완료)	80
2022년	2단계 공사 완료	100
2022년 이후	없음	

PH

투자계획 對 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	23,000	5,500	1,400	667	4,433	5,500	5,500	-	8,067	5,500	1,400	667	-	-	-
국비	12,700	3,300	840	400	2,660	2,750	2,750	-	4,840	3,300	840	700	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	10,300	2,200	560	267	1,773	2,750	2,750	-	3,227	2,200	560	467	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진실적

- 2016. 8. ~ 2017. 2. : 실시설계 및 계약심사 완료
- 2017. 3. ~ 2018. 2. : 총괄 및 1차분, 2차분 사업 착수
- 2018. 9. : 기본계획 수립 및 타당성 용역비 추경에 반영
- 2018. 10. : 구만지구 관광자원 개발사업 기본 및 타당성 용역발주
- 2018. 12. : 공사(1차, 2차분), 관급자재(모노레일, 짚 란인)기성


문제점 및 대책

- 추가 사업 추진에 따른 예상 사업비 110억원 국비지원 불투명
- 향후 균특사업 신청 시 신규 및 추가분 택일하여 사업신청

향후 추진 계획(또는 완료 시 추진성과)

- 2019. 4. : 기본 및 타당성 용역 완료
- 2019. 9. : 2021년 관광자원화 개발사업 신규 사업 제출
  - ※ 용지보상 협의 지속적인 추진
- 2020. 1. ~ 4. : 실시설계 용역추진
- 2021. ~ 2022. : 사업추진

## 현황 사진

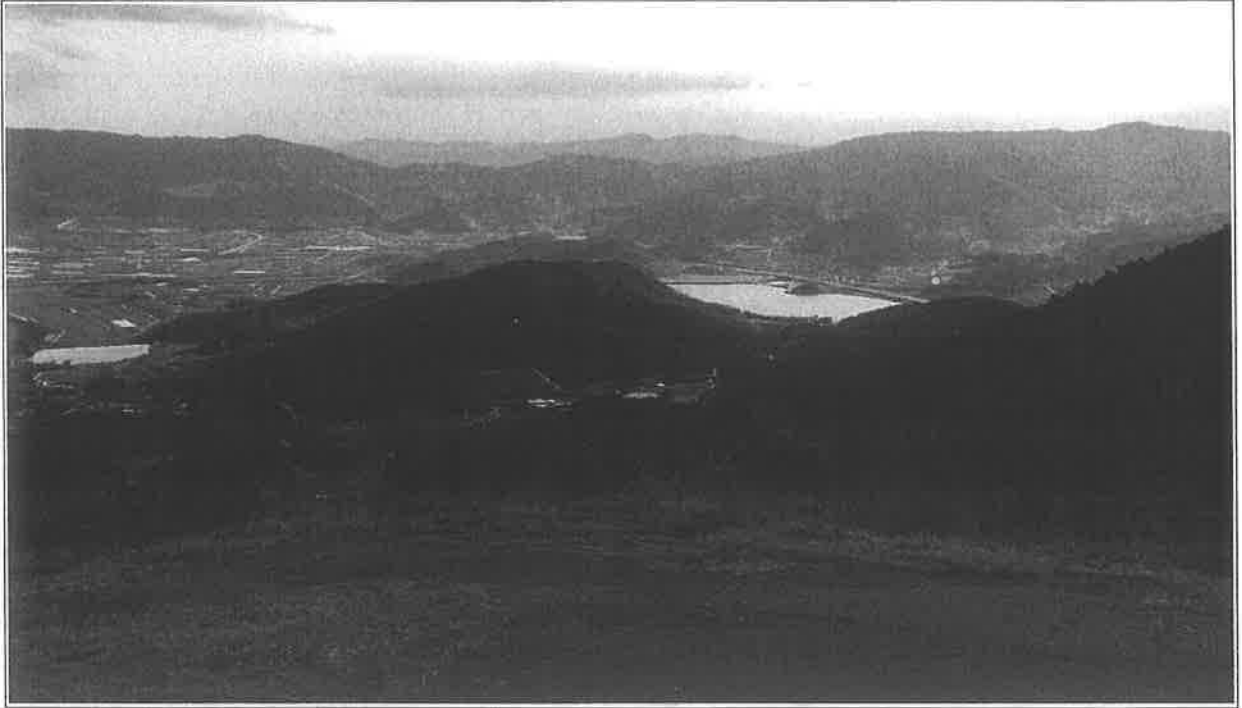

## 위치도

